

# Cynllun Twf Gogledd Cymru

Chwarter 1 2023-24

(Ebrill – Mehefin 2023)

Adroddiad Perfformiad

1.	Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio .....	3
2.	Perfformiad y Portffolio .....	4
3.	Perfformiad y Rhaglen Ddigidol .....	5
4.	Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel .....	7
5.	Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo .....	9
6.	Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth .....	13
7.	Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel .....	15
8.	Olrhain Cynnydd y Prosiectau .....	17
9.	Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 2022 .....	18
10.	Tabl Olrhain - Trosolwg o gyflawni (Mawrth 2023) .....	19
11.	Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 2022 .....	20
12.	Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf .....	21
	ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf .....	22

Yn ystod y chwarter diwethaf, derbyniom gyfanswm hynod o 26 cynnig prosiect fel rhan o alwad y Cynllun Twf am brosiectau newydd. Dros y misoedd diwethaf, mae'r cynigion wedi bod yn asesu'r ceisiadau hyn yn drylwyr i adnabod y rhai sy'n dangos sut allant gefnogi ein heconomi i ffynnu, creu swyddi newydd a chyflwyno buddsoddiad i Ogledd Cymru.

Mae rhestr fer o chwe prif gystadleuydd wedi cael ei llunio a bydd ein bwrdd yn dewis yr enillwyr yn y pen draw. Bydd pob prosiect a ddewisir yn cael cyfle i fod yn rhan o'r Cynllun Twf, gan dderbyn cyfran o'r £30 miliwn o arian cyfalaf sydd ar gael.

Ym mis Mehefin, fe lansiom ein hymdrech i chwilio am bartner yn y diwydiant i weithio gyda ni i gyflawni'r Hwb Hydrogen Gwyrdd yng Ngogledd Cymru, gyda hyd at £11.2 miliwn o gyfalaf ar gael i alluogi galw'r diwydiant am hydrogen. Cynhaliwyd lansiad yr Her Ariannwr Hydrogen hwn ar ôl digwyddiad cyn-lansio, ym mis Ebrill, i hysbysu'r diwydiant a'r llywodraeth ynghylch y gystadleuaeth arfaethedig a chynllun ymgynghori pellach yn ystod mis Mai. Dyma gam gwych ymlaen ar gyfer y Rhaglen Ynni Carbon Isel ac edrychwn ymlaen i ddatgan manylion pellach yn y man. Mae'r cyfnod ymgeisio yn cau ar 8 Medi.

Cynhaliwyd Adolygiad Gateway 2 Achos Busnes Amlinellol prosiect Porth Caergybi ym mis Mehefin, a derbyniodd raddfa hyder cyflawni ambr. Mae'r raddfa hon yn dangos er ei bod yn ymddangos bod modd cyflawni'r prosiect yn hyfyw, mae materion arwyddocaol sydd angen sylw ar unwaith.

Roedd yr adroddiad adolygu yn tynnu sylw at ddeg argymhelliad hanfodol i sicrhau cynnydd llwyddiannus y prosiect. Yn eu mysg, gwnaed galwad frys i weithredu ynghylch y Gorchymyn Diwygio Harbwr, sydd ar hyn o bryd yn aros am gymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru. Mae ymdrin â'r mater hwn yn brydlon yn hanfodol er mwyn cynnal cynnydd a chyflawnder y prosiect.

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llofnodi memorandwm o ddealltwriaeth gyda'r Ganolfan Ymchwil Uwch Gynhyrchu (AMRC) a bydd yn edrych i sefydlu lleoliad yn Hwb Economi Gwledig Glynllifon i gefnogi busnesau SME gydag effeithiolrwydd a chynhyrchedd wedi'i awtomeiddio.

Yn olaf, rydym wedi lansio'r broses o gaffael rheolwr cronfa ar gyfer y prosiect Cronfa Ynni Lleol Blaengar; gweler y manylion ar Gwerthwchi Gymru



**Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio**

*Alwen Williams*

Themâu	Statws RAG	Sylwadau
Achos Busnes y Portffolio		Fe wnaeth y Bwrdd gymeradwyo diweddariad 2022 Achos Busnes y Portffolio ym mis Hydref ac mae wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol. Bydd gwaith i ddiweddarau Achos Busnes Portffolio 2023 yn cychwyn ym mis Gorffennaf ar ôl i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd wneud penderfyniad ynghylch y prosiectau amgen.
Piblinell Cyflawni		Mae'r prosiectau yn cael eu hasesu yn erbyn Achos Busnes Portffolio 2022 ar hyn o bryd. Fel y nodir yn yr adroddiad, mae sawl achos o oedi ar draws y Portffolio. Mae'r gwaith i liniaru'r oedi yma yn parhau ac mae Cronfa Cyflawni Portffolio wedi sefydlu ar gyfer 2023-24 i helpu i aeddfedu prosiectau er mwyn eu cyflawni eleni. Cynhyrchir profil diwygiedig fel rhan o ddiweddariad yr Achos Busnes Portffolio ar gyfer 2023.
Llywodraethu		Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.
Sicrwydd		Mae trydydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) wedi'i gwblhau ym mis Medi 2022, gyda'r adroddiad yn cyflawni gradd hyder 'Ambr' ar gyfer y portffolio. Cynhelir yr adolygiad nesaf yn ystod yr hydref 2023.
Adnoddau a Chapasiti		Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i lleihau gan 2.5 FTE dros y chwarter a fu. Mae'r contractau tymor penodol yn y tîm wedi'u hymestyn i fis Mawrth 2025, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y tymor byr.
Cyllid		Mae cyfanswm o £2.28m o arian y Cynllun Twf wedi cael ei wario hyd yma, gydag £1.8m o hwnnw ar y Ganolfan Prosesu Signal Digidol. Yn ystod Chwarter 1 mae £73k o'r Grant Cynllun Twf wedi cael ei wario.
Buddsoddiad		Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod y risg fwyaf ar draws y portffolio ac mae strategaeth buddsoddi yn cael ei datblygu i gefnogi'r tîm i fodloni'r targedau buddsoddi.
Risg		Mae risgiau lefel portffolio o ran caniatâd ac mae'r oedi yn parhau i fod yn uchel yn sgil materion lefel prosiect. Mae fforddiadwyedd yn parhau i fod yn risg uchel oherwydd chwyddiant parhaus, materion yn y gadwyn gyflenwi a chynnydd mewn costau adeiladu. Mae'r risg ynghylch capasiti wedi lleihau'n raddol yn sgil ymestyn contractau tymor sefydlog sy'n ymwneud â chyflawni'r Cynllun Twf ond mae'n parhau i fod yn uchel
Monitro a Gwerthuso Buddion		Mae'r gwireddu buddion, monitro a'r fframwaith gwerthuso wedi'i gwblhau a'i uwchlwytho i system adrodd newydd gyda phrofi terfynol wedi'i gynnal cyn lansio'n llawn. Mae'r diffiniadau dangosydd wedi'u cwblhau'n derfynol, yn amodol ar adolygiad gan y llywodraeth. Mae cam cyntaf yr hyfforddiant defnyddwyr ar gyfer y system adrodd wedi'i gwblhau.
Cyfathrebu ac Ymgysylltu		Fe lansiom yr Her Ariannwr Hydrogen gyda hyd at £11.2 miliwn o gyfalaf i gyflawni hwb hydrogen yn y rhanbarth, oedd yn cynnwys digwyddiad ym mis Ebrill gydag areithiau prif siaradwyr gwadd gan y Gweinidog Vaughan Gething a James Davies AS. Hefyd yn ystod y chwarter hwn fe lansiodd ein newyddlen newydd, gyda chyrhaeddiad o 630k, bron i 1000 o ryngweithiau ar y cyfryngau cymdeithasol ac achlysuron lle y cawsom ein crybwyll yn ddigidol, a thros 10k o ymweliadau i'r wefan.

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	---	--	---

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.	380	£158m	£41.7m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r rhan fwyaf o ail gam y caffael ar gyfer y prosiect DSP bellach wedi'i gyflawni. Yn ystod y chwarter hwn mae rolau newydd wedi'u hysbysebu, gan gynnwys rôl i berson graddedig. Mae strategaeth masnacheiddio i gynyddu cydweithrediad y diwydiant hefyd wedi'i ddatblygu, gyda phrosiect band llydan mawr dan arweiniad Bangor i fod i gyhwyn yn Ch2.</li> <li>Mae'r paratodau caffael ar gyfer y prosiect Ychydig % Olaf wedi symud ymlaen gyda chefnogaeth gan Adran Gwyddoniaeth, Arloesedd a Thechnoleg llywodraeth y DG. Mae angen deall y risg yn parhau o ran fforddiadwyedd a'r effeithiau posib yn dilyn y datganiad diweddar am oedi i fuddsoddiad band llydan gigabit llywodraeth y DG yn y rhanbarth.</li> <li>Mae achosion busnes wedi'u cyflwyno i'r bwrdd prosiect a'r PMO ar gyfer y prosiectau Safleoedd a Choridorau a Champysau Cysylltiedig Allweddol.</li> <li>Cyflwynwyd bid i'r Gronfa Ffyniant Gyffredin rhanbarthol, gan gynnwys cyllid ar gyfer ffrydiau gwaith sy'n cefnogi amcanion gwario'r Rhaglen.</li> </ul>



Mark Pritchard  
Aelod Arweiniol



Rebecca Lowry  
Uwch Berchennog Cyfrifol



Stuart Whitfield  
Rheolwr Rhaglen

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	---	--	---

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Canolfan Prosesu Signal Digidol</b> Prifysgol Bangor	Cyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Holl eitemau blwyddyn 2 wedi'u cyflawni heblaw am un eitem.</li> <li>Mae dwy swydd newydd wedi'u hysbysebu ac mae rôl peirianeg i raddedigion (18 mis) wedi'i chreu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yr eitem derfynol o'r caffael am yr ail flwyddyn i'w chyflawni</li> <li>Mae prosiect band llydan dan arweiniad y Ganolfan DSP i fod i gychwyn</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae caffael ail gam yr offer wedi bod yn llwyddiannus</li> <li>Mae'r strategaeth masnacheiddio wedi cael ei ddatblygu ymhellach i gynyddu cydweithio'r diwydiant</li> <li>Prosiect ar y trywydd iawn i gyflwyno yn erbyn y proffil cyflawni</li> </ul>
<b>Cysylltu'r Ychydig % Olaf</b> Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dogfennau caffael a chontractau wedi'u cwblhau</li> <li>Sgôp terfynol yr eiddo sydd wedi'u diffinio â chefnogaeth UK DSIT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trefniadau rheoli cymorthdaliadau wedi'u cwblhau'n derfynol</li> <li>Caffael yn cychwyn</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dogfennau caffael wedi'u cwblhau.</li> <li>Mae sgôp y prosiect wedi cael ei fireinio'n sylweddol i leihau'r risg fforddiadwyedd sy'n parhau hyd nes i'r caffael ddod i ben</li> <li>Yn ddiweddar mae'r DG wedi cadarnhau'r oedi i raglen buddsoddi yn y rhanbarth yn cynrychioli risg posib i ddiddordeb cyflenwyr</li> <li>Cyflwynwyd cais am arian am weithgarwch cefnogi i'r rhaglen SPF rhanbarthol</li> <li>Risg o oedi o 1-4 mis i'r targed cymeradwyaeth FBC a'r dyddiad cychwyn ar y safle</li> </ul>
<b>Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig</b> Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achos Amlinellol Strategol wedi'i gymeradwyo gan y bwrdd prosiect</li> <li>Gwaith wedi cychwyn ar Achos Busnes Amlinellol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achos Busnes Amlinellol wedi'i gyflwyno am gymeradwyaeth</li> <li>Gweithgarwch ymgysylltu â'r farchnad</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Yr opsiwn a ffafrir wedi'i hadnabod yn y rhestr fer SOC</li> <li>Diddordeb y farchnad yn parhau i fod yn isel, yn amodol ar brofi yn Ch2</li> <li>Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro</li> <li>Ar y trywydd iawn am gymeradwyaeth OBC erbyn mis Tachwedd 2024</li> </ul>
<b>Campysau Cysylltiedig</b> Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achos Cyfiawnhad Busnes wedi'i gymeradwyo gan y bwrdd ar gyfer y ffrwd gwaith LPWAN</li> <li>Achos Amlinellol Strategol ar gyfer y ffrwd gwaith Di-wifr Uwch yn agos i gael ei gwblhau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achos Busnes Amlinellol wedi'i gyflwyno</li> <li>Gweithgarwch ymgysylltu â'r farchnad</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae gan un ffrwd gwaith yn y prosiect achos cyfiawnhad busnes wedi'i gwblhau.</li> <li>Mae'r ffrwd gwaith sy'n weddill i fod i gynhyrchu SOC yn gynnar yn Ch2 ac mae ar y trywydd iawn ar gyfer cymeradwyaeth OBC erbyn mis Mawrth 2024</li> <li>Diddordeb y farchnad yn parhau i fod yn isel, yn amodol ar brofi yn Ch2</li> <li>Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro</li> <li>Cyflwynwyd cais am arian am weithgarwch cefnogi i'r rhaglen SPF rhanbarthol</li> </ul>

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)	Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	---	---

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.	980	£530m	£668.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ynni Lleol Blaengar:</b> Lanswyd y cam caffael ymgynghorydd cronfa ym mis Mehefin cyn datblygu'r Achos Busnes Llawn yn yr Hydref.</li> <li><b>Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth:</b> Lanswyd yr Her Ariannwr Hydrogen ym mis Mehefin gyda'r nod o benodi ariannwr erbyn diwedd 2023. Unwaith y bydd wedi'i benodi, bydd yr ariannwr yn arwain ar ddatblygu a chyflawni hwb hydrogen yn y rhanbarth.</li> <li><b>Egni:</b> Mae'r OBC a gymeradwywyd gan y Bwrdd Rhaglen ym mis Chwefror 2023 wedi'i ddiweddarau gan Brifysgol Bangor gyda newidiadau i'r sgôp, y gost a'r amserlen. O ystyried yr oedi arfaethedig, cefnogodd y Bwrdd Portffolio argymhelliad y PMO o ystyried bod cymeradwyaeth yr OBC wedi'i oedi hyd Ch3 23/24.</li> <li><b>Cydnorth (Morlais):</b> Mae OBC Cydnorth yn bwrw ymlaen yn dda gyda'r prosiect ar y trywydd am gymeradwyaeth OBC yng nghyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 27 Hydref.</li> <li><b>Trawsfynydd:</b> Mae Cwmni Egino wedi cyhoeddi pamffled Cwmni a'i ddsbarthu i ran-ddeiliaid. Mae eu Cynnig Busnes hefyd wedi'i gwblhau'n derfynol a'i ddsbarthu i Lywodraethau, yn nodi prif ofynion Llywodraeth y DG ar gyfer symud y prosiect yn ei flaen.</li> </ul>



Y Cynghorydd Llinos Medi  
Aelod Arweiniol



Dylan Williams  
Uwch Berchennog Cyfrifol



Henry Aron  
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)	Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	---	---

## 4. Perfformiad Rhaglen Ynni Carbon Isel

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Cydnherth (Morlais)</b> Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gwaith cyfalaf a ariennir gan WEFO ar brosiect seilwaith Morlais yn parhau ar gyllideb ac ar amserlen.</li> <li>Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Amlinellol a thrafodaethau gyda darpar fuddsoddwyr</li> <li>Datblygwyr llanwol wedi cyflwyno cynigion am Gontractau ar gyfer Gwahaniaeth Arwerthiant Rownd 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicrhau buddsoddwr i ariannu costau ychwanegol y prosiect Cydnherth</li> <li>Cyflwyno ac adolygu'r Achos Busnes Amlinellol</li> <li>Adolygiad Gateway 2</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sgôr wedi'i ddiwygio o wyrdd i ambr oherwydd costau cynyddol y prosiect ac oedi i dargedu cymeradwyaeth Achos Busnes Amlinellol o fis Gorffennaf i fis Hydref ac oedi 3-6 mis i'r dyddiad cychwyn ar y safle.</li> </ul>
<b>Hwb Hydrogen</b> Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cynnal digwyddiad briffio cyn lansio ar gyfer Her Ariannwr Hydrogen ac ymgynghori â'r diwydiant a'r llywodraeth ar y gystadleuaeth arfaethedig</li> <li>Lansio'r Her Ariannu Hydrogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyflawni'r broses gystadleuol Her Ariannwr Hydrogen</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae sgôr ambr yn adlewyrchu'r risg bod yr amserlen ar gyfer cyflawni'r prosiect ar ôl yr Her Ariannwr Hydrogen yn aneglur ar y cam hwn</li> </ul>
<b>Egni</b> Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae trefniadau llywodraethu newydd yn eu lle ar gyfer y prosiect</li> <li>Mae'r achos busnes amlinellol a gymeradwywyd gan y Bwrdd Rhaglen ym mis Chwefror 2023 wedi'i ddiweddarau gan Brifysgol Bangor gyda newidiadau i'r sgôp, y gost a'r amserlen. O ystyried yr oedi arfaethedig, cefnogodd y Bwrdd Portffolio argymhelliad y PMO bod cymeradwyaeth yr OBC yn cael ei oedi hyd Ch3 23/24.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caffael tîm proffesiynol i ddatblygu'r prosiect</li> <li>Cynnydd drwy'r camau RIBA cyn caffael prif gontractwr yn ystod Ch4 23/24.</li> <li>Cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol wedi'i amserlenni ar gyfer Ch3 23/24</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Statws ambr yn adlewyrchu'r trefniadau llywodraethu a rheoli prosiect wedi'i wella a'r oedi 13-16 i ddechrau ar y safle. Statws Ambr yn sgil yr oedi o hyd at 13 mis i amserlen cyflwyno'r prosiect</li> </ul>
<b>Ynni Lleol Blaengar</b> Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i'r broses sicrwydd</li> <li>Ymgysylltu â'r farchnad yn gynnar gyda chynghorwyr cronfa posib</li> <li>Mae 31 Ten wedi'u caffael i gefnogi datblygiad yr FBC a darparu mewnbwn i werthusiad tendrau ymgynghorwyr y gronfa</li> <li>Gyda chefnogaeth gan yr ymgynghorwyr 31Ten, mae'r PMO wedi darparu sgôp gwaith drafft ar gyfer caffael ymgynghorydd cronfa a lansio'r broses caffael</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gorffen caffael ymgynghorydd cronfa</li> <li>Datblygu Strategaeth y Gronfa</li> <li>Paratoi'r Achos Busnes Llawn i'w chymeradwyo yn ystod Ch3 23/24</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ar amser ar gyfer cymeradwyo'r FBC erbyn mis Rhagfyr 2023 a dim materion arwyddocaol i'w hadrodd. Mae sgôr ambr yn adlewyrchu'r ffaith bod y prosiect wedi derbyn sgôr Adolygiad Gateway ambr.</li> </ul>
<b>Trawsfynydd</b> Cwmni Eginio	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cynnig Busnes wedi'i gwblhau'n derfynol a'i ddsbarthu i'r llywodraeth a rhan-ddeiliaid allweddol. Bellach, mae'r amcan gost o gyrraedd y penderfyniad buddsoddi terfynol yn £250m sydd wedi cael ei adolygu i lawr o'r amcanion cynharaf</li> <li>Mae taflen y cwmni wedi'i chynhyrchu ac wedi'i dosbarthu i ran-ddeiliaid</li> <li>Mae'r llythyr cylch gwaith a'r llythyr ariannu yn dal gyda Gweinidog Llywodraeth Cymru er ystyriaeth</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parhau i ddatblygu Achos Busnes Amlinellol drafft.</li> <li>Llywodraeth y DG a Great British Nuclear yn datblygu'r safle a dewis technoleg ar gyfer prosiectau niwclear newydd</li> <li>Bwrw ymlaen â'r broses gwneud cais am newid ar gyfer y lleihad arfaethedig mewn costau o</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gradd Ambr yn adlewyrchu'r ansicrwydd ynghylch amserlen cyflawni prosiectau a'r posibilrwydd o oedi pellach.</li> </ul>



			ddatblygu'r prosiect hyd y penderfyniad buddsoddi terfynol.		

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.	2280	£1.29bn	£355.4m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Warren Hall, Brychdyn</b> - Cyfarfu Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru ym mis Mehefin a chytunwyd bod y pedwar prawf oedd wedi'u cynnwys yn ymateb y Llywodraeth i argymhellion y Panel Adolygu Ffyrdd wedi cael eu cwrdd a bod modd bwrw ymlaen i ddatblygu'r prosiect. Mae Llywodraeth Cymru yn penodi ymgynghorydd i adolygu effaith yr Achos Diogelwch Maes Awyr ar y safle.</li> <li>• <b>Porth y Gorllewin, Wrecsam</b> - mae argymhellion Panel Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r safle yn cael eu hystyried gan y Cyngor a'r gallu i gyflawni'r prosiect yn cael ei asesu yn sgil y penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen â'r gwaith uwchraddio cyffyrdd ar yr A483...</li> <li>• <b>Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych</b> - mae Uchelgais Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros a'u hymgyngorwyr Avison Young bellach yn y broses o symud y prosiect i gyflawni yn dilyn y penderfyniad i ddarparu cyllid ychwanegol o'r Cynllun Twf gyda deialog ar gostau, cydsyniad a'r achos busnes diwygiedig.</li> <li>• <b>Porth Caergybi</b> - cynhaliwyd asesiad Adolygiad Gateway 2 ar brosiect ymestyn Porthladd Caergybi ym mis Mehefin ac fe'i haseswyd yn ambr ** gydag un blociwr a nifer o argymhellion critigol a hanfodol. Mae'r adroddiad Adolygu wedi cael ei derbyn gan Stena ac mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi uchafu'r blociwr Gorchymyn Adolygu Harbwr i Weinidogion Llywodraeth Cymru fel risg 'du' gyda goblygiadau difrifol ar gyfer y prosiect. Mae'r adroddiad Adolygu wedi cael ei dderbyn gan Stena ac mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi uchafu'r blociwr Gorchymyn Adolygu Harbwr i Weinidogion Llywodraeth Cymru fel risg 'du' gyda goblygiadau difrifol ar gyfer y prosiect.</li> <li>• <b>Parc Bryn Cegin, Bangor</b> - Mae briff y tendr ar gyfer penodi'r tîm proffesiynol o ymgynghorwyr wedi cael ei ddychwelyd ac mae'r ymatebion wrthi'n cael eu hadolygu.</li> </ul>



Y Cyngorydd Jason McLellan  
Aelod Arweiniol



Andrew Farrow  
Uwch Berchennog Cyfrifol



David Mathews  
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)	Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)	Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	---	---

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Porth y Gorllewin, Wreccsam</b> Cyngor Bwrdeistref Sirol Wreccsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r Cyngor am adolygu'r prosiect i asesu ei gyflwyniad o ystyried yr argymhellion gan bedwar prawf yr Adolygiad Ffyrdd a Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddi mewn priffyrdd.</li> <li>Mae Dŵr Cymru yn bwrw ymlaen â'u hadolygiad o redlif ffosffad o'u gweithfeydd trin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dull y cytunwyd arno gyda'r Cyngor ac Uchelgais Gogledd Cymru o ran cyflawni'r prosiect gan ystyried prif gynllunio ac amserlenni cyflawni yn sgil y penderfyniad adolygiad ffyrdd.</li> <li>Dŵr Cymru i gadarnhau'r lefelau rhedlif trwyddedig mewn Gweithfeydd Trin ar gyfer Ffosffadau, a pha weithfeydd sydd angen buddsoddiad ac sydd â digon o gapasiti ar gyfer lefelau rhedlif presennol.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae sgôr risg y prosiect wedi newid i goch, tra mae'r adolygiad o allu'r prosiectau i gwrdd â phrofion y Llywodraeth am fuddsoddiad priffyrdd yn cael ei gynnal.</li> </ul>
<b>Warren Hall, Brychdyn</b> Llywodraeth Cymru / Bwrdd Uchelgais Economaidd	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytunodd Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru bod y prosiect yn medru bwrw ymlaen yn unol â phedwar prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith priffyrdd newydd.</li> <li>Mae Llywodraeth Cymru yn penodi ymgynghorydd i asesu a lliniaru effaith yr achos diogelwch maes awyr ar safle'r prosiect.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru i ddarparu eu hadroddiad drafft ar yr effaith a mesurau lliniaru'r achos diogelwch maes awyr ar safle'r prosiect.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sgôr risg y prosiect yn parhau yn ambr gan bod cwrdd yr achos diogelwch maes awyr yn dal angen cael ei asesu'n llawn.</li> </ul>
<b>Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych</b> Jones Bros (Ruthin) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materion sydd bellach yn cael eu trafod/ symud ymlaen yw cynllunio (amodau a chydsynio), datblygu achosion busnes, costau diwygiedig a chyflwyno'r gwaith yn raddol.</li> <li>Proses wedi'i chytuno ar gyfer caffael cam 1 y gwaith</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cwblhau diwygio'r achos busnes amlinellol sy'n ymgorffori'r Senario Datblygu Graddol a'r llwybr caffael.</li> <li>Cael cyngor cymorth cymhorthdal gan ymgynghorwyr allanol.</li> <li>Ni fydd y gwaith o adeiladu'r tŷ ystlumod yn cychwyn hyd nes i'r Achos Busnes Llawn gael ei gymeradwyo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sgôr risg y prosiect wedi newid yn ambr yn sgil newid yn y proffil gwario sy'n gysylltiedig â'r gwaith adeiladu tŷ ystlumod bellach ddim yn cychwyn hyd nes i'r achos busnes llawn gael ei gymeradwyo.</li> </ul>

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	---	--	---	--	---

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Parc Bryn Cegin, Bangor</b> Llywodraeth Cymru / Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae briff tendr Llywodraeth Cymru i benodi'r tîm proffesiynol wedi cau ac mae'r tendrau'n cael eu sgorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llywodraeth Cymru i benodi tîm ymgynghoriaeth i ddylunio a datblygu'r prosiect.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Newid yn y proffil gwario gan bod y broses caffael yn cymryd mwy o amser na'r hyn a sgopiwyd yn wreiddiol. Ddim yn berthnasol o ran cyflawni'r prosiect a'r risg o gynnydd mewn costau yn sgil yr oedi yn cael ei liniaru. Y prosiect yn cadw ei sgôr risg gwyrdd.</li> </ul>
<b>Porth Caergybi</b> Stena Line Ports Limited	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad Gateway 2 ar gyfer yr Achos Busnes Amlinellol wedi adrodd asesiad hyder ambr ond gyda 10 argymhelliad critigol. Mae'r rhain yn cael sylw gan Stena ac Uchelgais Gogledd Cymru.</li> <li>Mae'r Bwrdd wedi ysgrifennu at Weinidogion Cymru yn mynegi eu pryder ynghylch yr oedi o ran cymeradwyo'r Gorchymyn Adolygu Harbwr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cwblhau Achos Busnes Amlinellol drafft ar gyfer cyflawni'r gwaith o wella capasiti'r porthladdoedd.</li> <li>Disgwylir y penderfyniad ar y Gorchymyn Adolygu Harbwr y chwarter hwn</li> <li>Cyngor cymorth cymhorthdal gan Pinsent Masons</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Y sgôr risg yn aros yn ambr ond roedd adroddiad adolygu Gateway 2 yn nodi materion critigol a hanfodol sydd angen sylw gan Stena / Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru.</li> </ul>

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, gan wneud y gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n tirwedd.	380	£281m	£41.3m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rhwydwaith Talent Twristiaeth</b> - mae Grŵp Llandrillo Menai yn cwblhau eu Hachos Busnes Amlinellol (OBC) drafft gan ymgorffori adborth gan y Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) ac Adolygiadau Gateway. Mae gweithio drwy fanylion caffael penodol cymhleth wedi arwain at beth oedi (1-2 mis) gyda'r prosiect bellach yn gweithio tuag at ystyried yr Achos Busnes Amlinellol terfynol gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Medi 2023.</li> <li><b>Hwb Economi Gwledig Glynllifon</b> - Mae ffocws y prosiect wedi bod ar reoli'r arolygon ychwanegol ar gais Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW, gan weithio tuag at gymeradwyo'r Achos Busnes Llawn yn gynnar yn 2024. Mae Grŵp Llandrillo-Menai wedi llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda'r Ganolfan Ymchwil Uwch Gynhyrchu (AMRC) yn cadarnhau cytundeb i AMRC gael lle yn yr Hwb i gefnogi busnesau SME rhanbarthol gydag awtomeiddio, effeithiolrwydd a chynhyrchedd. .</li> </ul>



Cyng Charlie McCoubrey  
Aelod Arweiniol



Sioned Williams  
Uwch Berchennog Cyfrifol



Robyn Lovelock  
Rheolwr Rhaglen

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	---	--	---

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Hwb Economi Gwledig Glynllifon</b> Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gwaith arolygu pellach ar y gweill ar gais Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW</li> <li>Gweithio gyda'r PMO i gadarnhau amserlen ddiwygiedig ar gyfer drafftio ac adolygu'r Achos Busnes Llawn gan weithio tuag at gymeradwyo yn gynnar yn 2024.</li> <li>Memorandwm o Ddealltwriaeth wedi'i lofnodi gyda'r Ganolfan Ymchwil Uwch Gynhyrchu (AMRC) i gael lle yn GREH i gefnogi'r busnesau SME gydag awtomeiddio, effeithiolrwydd a chynhyrchedd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parhau â gwaith arolwg pellach</li> <li>Drafftio'r Achos Busnes Llawn.</li> <li>Cydweithio gydag Uchelgais Gogledd Cymru i ddatblygu a dechrau gweithredu cynllun cyfathrebu rhanddeiliaid</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r sgôr yn parhau i fod yn goch oherwydd oedi gyda'r prosiect a chan nad yw caniatâd cynllunio wedi'i sicrhau eto</li> </ul>
<b>Rhwydwaith Talent Twristiaeth</b> Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gweithio i ymgorffori adborth ar yr Achos Busnes Amlinellol (OBC) drafft gan ymgorffori adborth gan y Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) ac Adolygiadau Gateway</li> <li>Cymryd rhan yn y gwaith o ddysgu â chymorth mewn hyfforddiant allyriadau carbon i ystyried sut y bydd y prosiect yn lleihau allyriadau carbon yn erbyn targedau Uchelgais Gogledd Cymru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol (OBC) a'r dogfennau ategol perthnasol gan ragweld y bydd yn cyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Medi 2023</li> <li>Gweithio gyda'r PMO er mwyn datblygu cytundeb ariannu yn benodol i'r prosiect.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae gweithio drwy fanylion y caffael pwrpasol wedi arwain at oedi o 1-2 mis gan newid y risg amser i Ambr.</li> </ul>

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	---	--	---

Nod y Rhaglen	Targed Creu Swyddi	Targed Buddsoddi GVA	Cyfanswm Targed Buddsoddi
Cyflwyno lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.	180	£114m	£39.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter</b> - mae Prifysgol Wrecsam yn paratōir Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect i'w ystyried gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Tachwedd 2023.</li> <li><b>Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol</b> - Mae Prifysgol Bangor wedi cyflwyno eu Hachos Cyfiawnhad Busnes i'r Swyddfa Rheoli Portffolio i'w adolygu, a rhagwelir y bydd yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Rhagfyr 2023.</li> </ul>



Cyng, Dyfrig Siencyn  
Aelod Arweiniol



Paul Bevan  
Uwch Berchennog Cyfrifol




Robyn Lovelock  
Rheolwr Rhaglen

	Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)		Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)		Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)
--	--	--	---	--	---

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter</b> Prifysgol Glyndŵr Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penodwyd Wynne Construction (cwmni o Ogledd Cymru) ar gyfer cam un EEOC Dylunio ac Adeiladu y prosiect. Maent yn rhoi eu tîm ar waith ac mae gwaith wedi cychwyn ar bethau y gellir eu cyflawni.</li> <li>Penodwyd ymgynghorydd M&amp;E arbenigol i wneud gwaith sgopio wedi'i ddiweddarau o'r gwaith sydd ei angen yn OpTIC, gyda thendr am y gwaith i fod i gael ei gyflwyno ar ddiwedd yr haf.</li> <li>Mae gwaith ar yr achos busnes llawn yn parhau gyda'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn adolygu'r achos strategol drafft.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cychwyn ar y gweithdai gyda Wynne Construction.</li> <li>Drafftio'r achosion economaidd, masnachol, ariannol a rheoli ar gyfer yr achos busnes llawn.</li> <li>Sesiwn ymgysylltu â busnesau ym mis Mehefin.</li> <li>Prosiect ar y trywydd iawn er mwyn i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ystyried yr Achos Busnes Llawn ym mis Tachwedd 2023 a chychwyn ar y safle ym mis Chwefror 2024</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r prif faterion o ran cost ac amser wedi'u datrys</li> <li>Dyddiad cychwyn disgwylidig ar y safle wedi'i oedi gan hyd at 6 mis</li> </ul>
<b>Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol</b> Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Cyfiawnhad Busnes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drafft o'r Achos Cyfiawnhad Busnes wedi'i gyflwyno am adolygiad gan y Swyddfa Rheoli Portffolio</li> <li>Llywodraethu mewnol newydd bellach yn ei le ac Uwch Swyddog Cyfrifol Prosiect wedi'i benodi - Michael Flanagan, Prif Swyddog Trawsnewid Prifysgol Bangor.</li> <li>Adolygiad Sicrwydd Prosiect wedi'i gynllunio ar gyfer mis Medi 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer safle Henfaes</li> <li>Cynnwys adborth o Adolygiad y Swyddfa Rheoli Portffolio cyn Adolygiad Sicrwydd Prosiect Llywodraeth Cymru ym mis Medi.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r sgôr yn parhau i fod yn goch oherwydd oedi dro ar ôl tro mewn prosiectau ac effaith cais newid cyllid cyfatebol a newid lleoliad ar Amcanion Gwariant y Rhaglen.</li> </ul>



Prosiect	Cam Caniatâd				Cam 1	Cam 2	Cam 3	Cam 4	Cam 5	Cam 6	Cam 7	Cam 8
	Y cyfnod cyn gwneud cais	Cynllunio amlinellol / Caniatâd	Cynllunio o llawn / Caniatâd	Amodau wedi'u gweithredu	Pennu cyd-destun y Prosiect	Paratoir Achos Amlinellol Strategol	Paratoir Achos Busnes Amlinellol	Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol	Paratoir Achos Busnes Llawn	Approval of the Full Business Case	Y cyfnod cyn gwneud cais	Cynllunio amlinellol / Caniatâd
Canolfan Prosesu Signalau Digidol	Dim angen cynllunio				✓	✓	✓	✓	✓	✓	⌚	
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Allweddol	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	⌚						
Campysau Cysylltiedig	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	⌚						
Yr Ychydig % Olaf	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	✓	✓	⌚			
Cydnherth (Morlais)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⌚					
Trawsfynydd	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	⌚						
Egni	⌚				✓	✓	⌚					
Ynni Lleol Blaengar	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	✓	✓	⌚			
Datgarboneiddio Trafnidiaeth (Hwb Hydrogen)	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	⌚					
Porth Caergybi, Ynys Môn	Gorchymyn Adolygu Harbwr wedi gyflwyno a Thrwydded Morol wedi rhoi				✓	✓	⌚					
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru	✓	✓	✓	⌚	✓	✓	⌚					
Porth y Gorllewin, Wrecsam	Mabwysiadur CDLI ar ôl				✓	⌚						
Neuadd Warren, Brychdyn	⌚				✓	⌚						
Parc Bryn Cegin, Bangor	⌚				✓	✓	⌚					
Hwb Economi Wledig Glynllifon	⌚				✓	✓	✓	✓	⌚			
Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	✓	⌚				
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	⌚				✓	✓	⌚					
Canolfan Opteg a Pherianeg Menter	✓	✓	✓	⌚	✓	✓	✓	✓	⌚			

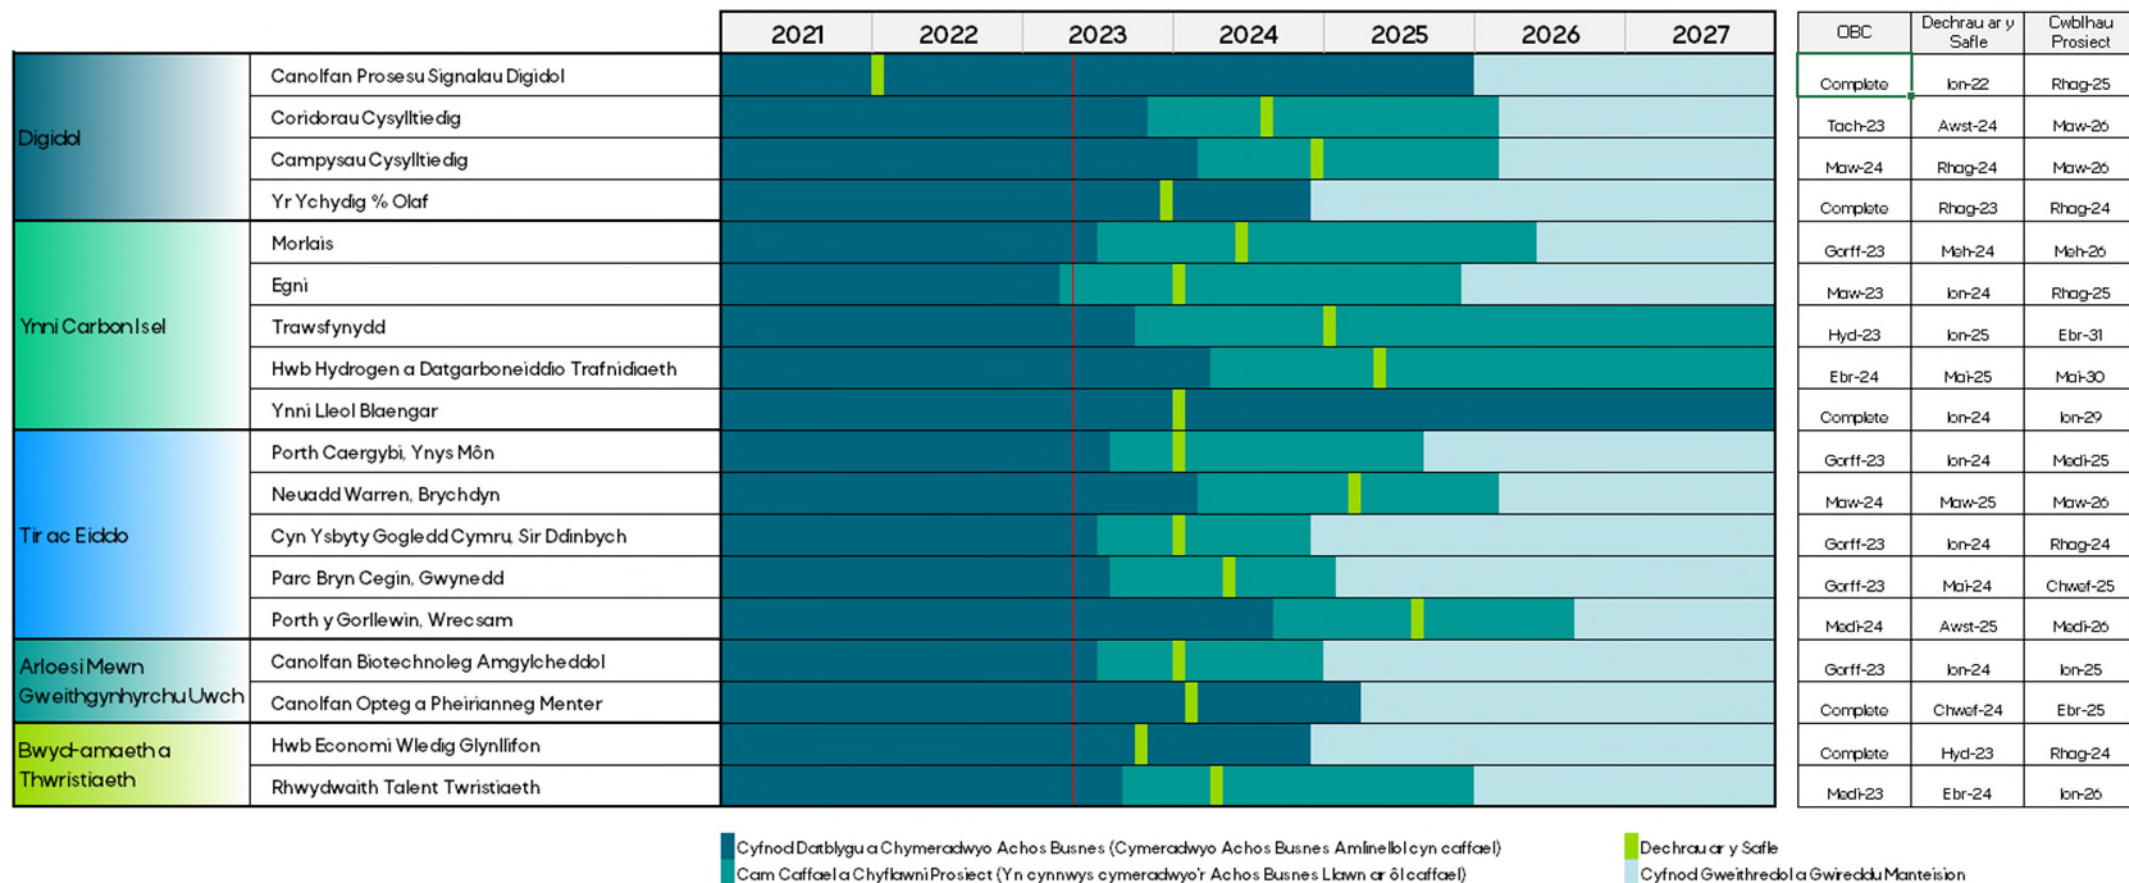

Mae'r statws RAG ar gyfer pob prosiect yn cael ei asesu yn erbyn y proffil hwn o Achos Busnes Portffolio 2022 oni bai bod amserlen newydd wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais drwy achos busnes prosiect neu gais am newid

# 10. Tabl Olrhain - Trosolwg o gyflawni (Rhagfyr 2022)

		Targedau Achos Busnes Portffolio 2020***			Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd wedi'u Cymeradwyo				Gwahaniaeth		
		GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC/FBC*	GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	GVA (EM)	Swyddi a grëwyd	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	50	80	7.3	FBC	12	33	3.0	-38	-47	-4.3
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	35	150	4.0	OBC	15	130	4.0	-20	-20	0
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	45	120	9.4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Campysau Cysylltiedig	35	0	21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	50	100	36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	60	90	28.6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Egni	20	20	97.7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Ynni Lleol Blaengar	120	180	106.2	OBC	122	174	106	+2	-6	0
	Trawsfynydd	230	510	400	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	220	360	43.4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Warren Hall, Brychdyn	235	440	70	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	20	50	74	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Parc Bryn Cegin, Bangor	30	50	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Porth Caergybi	545	930	80	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Hwb Economi Gwledig Glynllifon	25	40	13	OBC	45	96	13	+20	+56	0
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	20	0	12.9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	45	70	29.9	OBC	33	61	14.7	-12	-9	-15.2
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	60	90	9.6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Cyfanswm Portffolio'r Cynllun Twf</b>		<b>2,185</b>	<b>3,830</b>	<b>1,146</b>	<b>4OBC + 1FBC</b>	<b>227</b>	<b>494</b>	<b>140.7</b>	<b>-48</b>	<b>-26</b>	<b>-19.5</b>

\* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 15% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

\*\* OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

\*\*\* Targedau ar gyfer y prosiect sydd wedi'i dynnu'n ôl yn dal wedi'u cynnwys fel rhan o gyfanswm targedau'r Cynllun Twf.

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	2021/22 £m*	2022/23 £m*	2023/24 £m	2024/25 £m	2025/26 £m	2026/27 £m	2027/28 £m	2028/29 £m	2029/30 £m	2030/31 £m	2031/32 £m	2032/33 £m	Cyfanswm £m
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.12	1.66	0.39	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
	Cysylltu'r Ychydig % Olaf	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	1.21	1.72	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	0.50	4.00	2.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
	Campysau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	3.94	10.10	4.93	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
Ynni Carbon Isel	Cydherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	3.33	4.44	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23
	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
	Ynni Lleol Blaengar	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	1.50	3.00	9.25	9.25	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Egino	0.00	0.00	0.00	1.97	2.96	4.92	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Bwrdd Uchelgais Economaidd	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
	Warren Hall, Brychdyn	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	1.74	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
	Paro Bryn Cegin, Bangor	Bwrdd Uchelgais	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
	Porth Caergybi	Stena line	0.00	0.00	4.17	15.51	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Hwb Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	7.20	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Glyndŵr	0.00	0.00	1.62	6.93	3.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	1.25	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
<b>I'w cadarnhau</b>	<b>Prosiect(au) newydd</b>	<b>I'w cadarnhau</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>	<b>4.75</b>	<b>4.75</b>	<b>4.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.34</b>
<b>Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (2%)</b>															<b>4.80</b>
<b>Cyfanswm</b>															<b>240.00</b>

\* proffil 2021/22 ac 2022/23 yw'r gwariant gwirioneddol. Mae'r proffil sy'n weddill fel y rhagwelwyd yng Nghyllideb Cyfalaf 2023/24.

\*\*\* Targedau ar gyfer y prosiect sydd wedi dynnu'n ôl yn dal wedi'u cynnwys fel rhan o gyfanswm targedau'r Cynllun Twf.

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	Proffil 23/24 (£m)	YTD Gwirioneddol (£m)	Amrywiad (£m)*	Sail Resymegol
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.39	0.00	-0.39	Mae un hawliad yn ddyledus ar gyfer y prosiect DSP yn ystod y flwyddyn.
	Cysylltu'r Ychydig % Olaf	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	1.21	0.00	-1.21	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Campysau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2022 Achos Busnes y Portffolio.
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	
	Ynni Lleol Blaengar	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Eginio	0.00	0.00	0.00	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2022 Achos Busnes y Portffolio.
	Warren Hall, Brychdyn	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	1.74	0.00	-1.74	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Porth Caergybi	Stena line	4.17	0.00	-4.17	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Hwb Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2022 Achos Busnes y Portffolio.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Glyndŵr	1.62	0.00	-1.62	Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2022 Achos Busnes y Portffolio.
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	1.25	0.00	-1.25	
<b>Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (2%)</b>			<b>0.87</b>	<b>0.076</b>	<b>-0.794</b>	
<b>Cyfanswm</b>			<b>11.25</b>	<b>0.074</b>	<b>-11.174</b>	<b>Weler uchod</b>

\* Amrywiaeth yw'r gwahaniaeth rhwng y proffil a gynlluniwyd (Achos Busnes y Portffolio 2022) a gwariant Gwirioneddol y Flwyddyn Hyd Yma (YTD).

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr	Crynodeb
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	Cysylltu'r Ychydig % Olaf	Bwrdd Uchelgais Economaidd	Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill ac na allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais Economaidd	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffiberoptig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	Campysau Cysylltiedig	Bwrdd Uchelgais Economaidd	Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	Cydnerth (Morlais)	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	Bwrdd Uchelgais Economaidd	Cefnogi cyflwyno prosiect enghreifftiol yn cynnwys cynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn rhwydweithiau trafndiaeth rhanbarthol.
	Egni (Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel)	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnffuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd
	Ynni Lleol Blaengar	Bwrdd Uchelgais Economaidd	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	Trawsfynydd	Cwmni Eginio	Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch (AMR). Ar y cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn.
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Bwrdd Uchelgais Economaidd	Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.
	Warren Hall, Brychdyn	Bwrdd Uchelgais Economaidd	Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Bwrdd Uchelgais Economaidd	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Bwrdd Uchelgais Economaidd	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg
	Porth Caergybi	Stena Line	Sicrhau dyfodol porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol.

Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Hwb Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru.
Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Glyndŵr	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.
