



Uchelgais Gogledd Cymru
Ambition North Wales

Cynllun Twf Gogledd Cymru Adroddiad Perfformiad Chwarterol

2024-25 Chwarter 3 (Hydref - Rhagfyr 2024)

CYNNWYS

01	Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio	3
02	Perfformiad y Portffolio	4
03	Perfformiad y Rhaglen Ddigidol	5
04	Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel	7
05	Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo	10
06	Perfformiad y Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	13
07	Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	15
08	Olrhain Cynnydd y Prosiectau	17
09	Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf- Achos Fusnes y Portffolio 2024	18
10	Traciwr Amcanion - Trosolwg o gyflawni (Rhagfyr 2024)	19
11	Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf	20
12	Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyranriad Cyllid Cyfalaf	21
	ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau y Cynllun Twf	22

01 CRYNODEB Y CYFARWYDDWR PORTFFOLIO

Yn ystod y chwarter cymeradwywyd Achos Busnes Amlinellol Parc Bryn Cegin gan y Bwrdd Uchelgais: nod y prosiect yw darparu unedau cyflogaeth modern, carbon isel ac ynni effeithlon ym Mharc Bryn Cegin, Bangor gan greu cyfleoedd newydd o ran cyflogaeth ac ehangu busnesau. Mae'r cais cynllunio ar gyfer y safle hefyd wedi ei gyflwyno i Gyngor Gwynedd i'w ystyried. Mae'r Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, i'w gyflwyno am gymeradwyaeth gan y Bwrdd yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais Economaidd hefyd y cais am newid am gynnwys siglen yn y Prosiect Anturiaethau Cyfrifol, mae Achos Busnes Amlinellol y prosiect yn cael ei gwblhau yn barod i'w gyflwyno drwy'r broses gymeradwyo ym mis Ionawr/Chwefror.

Mae Achos Busnes y Portffolio wedi'i ddiweddarau ac wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol.

Cynhaliwyd Adolygiad Porth Portffolio blynyddol y Cynllun Twf gan banel o arbenigwyr annibynnol yn ystod mis Hydref. Ar hyn o bryd mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) yn gweithio ar fynd i'r afael â'r 4 argymhelliad a nodir yn yr adroddiad.

Yn ystod y chwarter penodwyd dau ymgynghorydd cronfa i ymgymryd â'r gwaith o baratoi ein Cronfa Ynni Glân, sydd i'w lansio yn 2025. Bydd CGGC yn gweithio ar y cyd ag Ynni Cymunedol Cymru ar is-gronfa'r sector gwirfoddol a bydd Umi yn arwain yr is-gronfa sy'n targedu'r sector preifat. Mae'r strategaeth fuddsoddi yn cael ei datblygu ar gyfer y gronfa fel rhan o'r gwaith paratoi ar gyfer cymeradwyo'r Achos Busnes.

Daeth yr ymgynghoriad â'r diwydiant ar gyfer y prosiect Safleoedd Allweddol a Choridorau Cysylltiedig 4G+ i ben yn ystod y chwarter; cafwyd adborth gwerthfawr i lywio dyluniad yr ymyriadau. Dechreuodd y prosiect Di-wifr Uwch ei ymgysylltiad â'r farchnad yn dilyn cymeradwyaeth OBC y chwarter diwethaf.

Mae'r ddaau brosiect o fewn y rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel yn gwneud cynnydd da. Mae'r gwaith o adeiladu'r Ganolfan Peirianeg Menter ac Opteg yn mynd rhagddo'n dda gyda'r adeilad bellach yn dal dŵr a'r gwaith gyda'r gosodion mewnol; aeth Hedd ac Eiliw i'r safle i weld y cynnydd yn ystod y chwarter. Mae'r gwaith ar adnewyddu safle Henfaes ar gyfer prosiect y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn datblygu'n unol â'r amserlen.

Ym mis Rhagfyr daeth nifer o ffrydiau gwaith a ariannwyd gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin i ben. Mae'r tîm wedi sicrhau estyniad i amserlen y prosiect er mwyn cwblhau'r ffrydiau gwaith eraill. Daeth gwaith craidd ar y prosiect SPF sy'n asesu dichonoldeb 'cytundebau mynediad' asedau sector cyhoeddus ar gyfer defnydd telathrebu i ben yn ystod y chwarter gyda chanlyniadau cadarnhaol.

Wrth edrych ymlaen at 2025 mae'n argoeli i fod yn flwyddyn gyffrous i Uchelgais Gogledd Cymru a'r Cynllun Twf. Mae gwaith ar y gweill i drosglwyddo'r Cynllun Twf a thîm y Swyddfa Rheoli Portffolio i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig erbyn 1 Ebrill. Rydym ar y trywydd iawn i weld nifer o brosiectau yn symud i'r cam cyflawni yn ystod y flwyddyn.



Alwen Williams

**Cyfarwyddwr Portffolio
Uchelgais Gogledd Cymru**

02 PERFFORMIAD Y PORTFFOLIO

Themâu	Statws RAG	Sylwadau
Achos Busnes y Portffolio		Cafodd diweddariad Achos Busnes y Portffolio 2024 ei gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais ym mis Hydref ac mae wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol.
Piblinell Cyflawni		Mae'r biblinell gyflenwi yn gyson ag Achos Busnes Portffolio 2024, gyda phrosiectau yn adrodd yn erbyn yr amserlen hon ar hyn o bryd.
Llywodraethu		Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.
Sicrwydd		Cwblhawyd pumed adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) ym mis Hydref 2024 gyda'r adroddiad yn darparu sgôr hyder 'Coch' ar gyfer y portffolio. Cynhelir adolygiad dilynol o Sicrwydd y Cynllun Gweithredu (AAP) ym mis Ebrill 2025.
Adnoddau a Chapasiti		Bydd Rheolwr y Rhaglen Ynni Carbon Isel yn gadael ei rôl ym mis Ionawr 2025; mae Rheolwr Rhaglen Ynni Carbon Isel dros dro wedi'i benodi am 6 mis wrth i ni benodi i'r swydd. Mae'r ymgyrch recriwtio ar y gweill ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd mae contractau cyfnod penodol (heb gynnwys staff a ariennir gan LEAP neu SPF) yn rhedeg tan fis Mawrth 2026, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y tymor byr.
Cyllid		Mae cyfanswm o £8.47m o gyllid y Cynllun Twf wedi'i wario hyd yma. Mae'r swm yn cynnwys £2.15m ar y Ganolfan Prosesu Signalau Digidol, £4.81m ar y Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter ac £1.51m i ariannu'r gwariant refeniw.
Buddsoddiad		Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sy'n angenrheidiol i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod yn risg arwyddocaol ar draws y portffolio. Cymeradwydd y Bwrdd Uchelgais y Strategaeth Fuddsoddi yn ystod eu cyfarfod ym mis Mawrth.
Risg		Mae'r proffil risg cyffredinol yn parhau i fod yn gyson â Chwarter 2. Mae caffael y fframwaith gwasanaethau cefnogi (argymhellid PAR 2023) ar y gweill a disgwylir y penodiad yn Ch4. Mae nifer o risgiau gweddilliol uchel yn parhau sy'n cael eu rheoli gan y PMO gan gynnwys fforddiadwyedd, cydsynio, oedi a buddsoddiad.
Monitro a Gwerthuso Buddion		Cynhaliwyd sesiynau hyfforddi gydag Uchelgais Gogledd Cymru a Noddwyr Prosiect ar sut i ddefnyddio'r platfform Adrodd am Fuddion. Mae'r holl brosiectau wedi uwchlwytho eu dangosyddion, mae'r ddau brosiect sydd yn y cam cyflawni wedi dechrau poblogi'r platfform gan alluogi timau'r prosiect, rhaglen a phortffolio i olrhain y cynnydd tuag at amcanion a buddion gwario.
Allyriadau a Bioamrywiaeth		Mae drafft terfynol y fethodoleg symlach yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd, yn barod i'w rannu yn gynnar yn 2025. Mae trafodaethau ar y gweill i ystyried cefnogi nifer fach o Awdurdodau Lleol fel 'Cynghorau Arloesi' fel modd o wreiddio'r fethodoleg. O dan arweiniad arbenigwyr pwnc Grant Thornton ac Arup, cynhaliwyd dwy sesiwn hyfforddi rithiol ym mis Tachwedd 2024, gyda thua 70 o swyddogion awdurdodau lleol ac amgylcheddol yn bresennol.
Cyfathrebu ac Ymgysylltu		Cyhoeddwyd datganiadau i'r wasg ar gymeradwyo'r achos busnes amlinellol ar gyfer y prosiect Di-wifr Uwch; ethol ein Cadeirydd a'n Is-gadeirydd newydd, ein prosiect Cysylltedd Digidol Gwledig a ariennir gan SPF, cyllid Launchpad Technoleg Amaeth newydd, prosiect Gwaith Treuliad Anaerobig Glannau Dyfrdwy gan sicrhau buddsoddiad llawn gan y sector preifat, a phenodi ymgyngorwyr cronfa i ysgogi ein Cronfa Ynni Glân. Drwy gydweithio gyda Business News Wales, cynhyrchwyd podlediad yn canolbwyntio ar swyddogaeth Uchelgais Gogledd Cymru, a gefnogwyd gan erthyglau gan aelodau o'r PMO. Drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, rhoddwyd sylw i'n gweithdy gwerth cymdeithasol, cyfraniadau mewn digwyddiadau, recriwtio, cyfleoedd tendro, a phe cyn o uchafbwyntiau diwedd blwyddyn i ddod â 2024 i ben. Parhau i dyfu wnaeth ein ymgysylltu a'n cyrhaeddiad ar y cyfryngau cymdeithasol, a chafwyd 8.4k o ddefnyddwyr gweithredol ar ein gwefan.

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Nod y Rhaglen


Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra gyda gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.



Targed Creu Swyddi
380



Targed Buddsoddi
GVA
£158m



Cyfanswm
Buddsoddiad
£41.7m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none">• Daeth ymgynghoriad manwl y diwydiant ar y prosiect Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig '4G+' i ben yn ystod y chwarter, a derbyniwyd adborth gwerthfawr i lywio dyluniad y pedwar ymyriad arfaethedig. Mae paratodau ar gyfer yr Achos Busnes Llawn bellach wedi datblygu'n dda.• Daeth gwaith craidd ar y prosiect SPF sy'n asesu dichonoldeb 'cytundebau mynediad' asedau sector cyhoeddus ar gyfer defnydd telathrebu i ben yn ystod y chwarter gyda chanlyniadau cadarnhaol.• Mae prosiect LPWAN Campysau Cysylltiedig bellach yn y cam dylunio rhwydwaith gyda chaffael cyfalaf i ddechrau yn ystod y chwarter nesaf. Mae'r prosiect Di-wifr Uwch wedi dechrau ymgysylltu â'r farchnad yn dilyn cymeradwyaeth OBC y chwarter diwethaf.• Mae dibyniaethau yn parhau mewn perthynas â phrosiectau Yr Ychydig % Olaf a Ffibr Llawn, sy'n gysylltiedig â buddsoddiad band eang Prosiect Gigabit Llywodraeth y DU, gyda disgwyl dyfarnu'r holl gontractau rhanbarthol erbyn y chwarter nesaf, fydd yn rhoi eglurder ynghylch ymyrraeth posib y Cynllun Twf.



Cyng. Mark Pritchard
Aelod Arweiniol



David Fitzsimon
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Stuart Whitfield
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)		Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor		Cyflawni Prosiect	<ul style="list-style-type: none"> Achos cyfiawnhad busnes terfynol ar gyfer trydydd gwedd y cyllid i brynu offer a gyflwynwyd i'w gymeradwyo. 	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo'r achos cyfiawnhad busnes a phrynu offer 		<ul style="list-style-type: none"> Yr Achos Cyfiawnhad Busnes Terfynol bellach wedi'i gyflwyno
Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf Uchelgais Gogledd Cymru		Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Prosiect cefnogaeth 'Cysylltedd Digidol Gwledig' y Gronfa Ffyniant Gyffredin wedi'i gwblhau. 	<ul style="list-style-type: none"> Contract buddsoddi band eang terfynol Llywodraeth y DU i'w ddyfarnu ar gyfer y rhanbarth 		<ul style="list-style-type: none"> Buddsoddiad Llywodraeth y DU mewn band eang yn y rhanbarth ar fin dechrau yn dilyn y caffael cyfredol ar gyfer ei fframwaith 'traws-ranbarthol'. Bydd canlyniad hyn yn diffinio safle ar gyfer ymyrraeth y Cynllun Twf.
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru	4G+	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Daeth ymgysylltiad 4G + â'r farchnad i ben a drafftwyd telerau'r cynlluniau ariannu. Gwaith 'Cytundebau Mynediad' y Gronfa Ffyniant Gyffredin wedi'i gwblhau 	<ul style="list-style-type: none"> Contract buddsoddi band eang terfynol Llywodraeth y DU i'w ddyfarnu ar gyfer y rhanbarth Achos Busnes Llawn 4G+ i'w gyflwyno ar gyfer adolygiad PMO 		<ul style="list-style-type: none"> Mae prosiect 4G + bellach wedi ymgynghori â gweithredwyr rhwydwaith i gadarnhau'r gofynion ar gyfer yr ymyriadau arfaethedig
	Ffeibr Llawn	Datblygu'r Achos Fusnes Amlinellol				
Campysau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru	Di-wifr Uwch	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Ymgysylltu â'r farchnad ar gyfer prosiect Di-wifr Uwch ar y gweill 	<ul style="list-style-type: none"> Cynllun grant ac Achos Busnes Llawn drafft ar gyfer y prosiect Di-wifr Uwch. 		<ul style="list-style-type: none"> Di-wifr Uwch bellach yn datblygu Achos Busnes Llawn.
	LPWAN	Cyflawni Prosiect	<ul style="list-style-type: none"> Mae dyluniad rhwydwaith LPWAN bellach wedi'i gyfarwyddo, gyda'r bwriad o'i gwblhau yn Ionawr 25 	<ul style="list-style-type: none"> Caffael offer ar gyfer y prosiect LPWAN a gwasanaethau gosod. Cynlluniau cyflwyno LoRaWAN y cynghorau i'w cyflwyno i Uchelgais Gogledd Cymru eu rhoi ar waith. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae LPWAN yn bwrw ymlaen gyda chynllunio rhwydwaith a pharatoir caffael uwch a chyfalaf.

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Nod y Rhaglen


Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.



Targed Creu Swyddi
980



Targed Buddsoddi
GVA
£530m



Cyfanswm
Buddsoddiad
£668.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> Cydnherth - Mae Achos Busnes Llawn Drafft wedi'i gyhoeddi yn dilyn cadarnhau costau'r prosiect a nodi datrysiad ar gyfer y bwch ariannu. Ynni Lleol Blaengar - Ymgynghorwyr Cronfa wedi'u penodi ac yn datblygu'r strategaeth fuddsoddi ar gyfer y gronfa i baratoi ar gyfer cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn yn Chwarter 1 2025-26. Egni - Prifysgol Bangor wedi cadarnhau y bydd datblygiad y prosiect yn cael ei ohirio nes bod sicrwydd ar gyllid Porthladd Rhydd Môn.



Cyng. Gary Pritchard
Aelod Arweiniol



Dylan Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Swydd Wag
Elgan Roberts
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cydnherth (Morlais) Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Costau terfynol wedi'u cwblhau. Achos Busnes Terfynol drafft wedi'i gynhyrchu. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno'r Achos Busnes Terfynol i'w gymeradwyo Cwblhau'r cytundeb ariannu terfynol. Cychwyn ar y safle. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect yn ambr tra bo'r Achos Busnes yn mynd drwy'r broses gymeradwyo.
NEW-H2 Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Uniper wedi cadarnhau eu bod yn tynnu'n ôl fel un o gyd-noddwyr y prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Ar hyn o bryd mae Wales and West Utilities, y cyd-noddwr arall, yn chwilio am opsiynau posibl i gydweithio â noddwr amgen i symud y prosiect ymlaen. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect yn goch ar ôl i Uniper dynnu yn ôl.
Egni Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Prifysgol Bangor wedi cadarnhau y bydd datblygiad y prosiect yn cael ei ohirio nes bod sicrwydd ar gyllid Porthladd Rhydd Môn. 	<ul style="list-style-type: none"> Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Llawn. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect wedi'i ohirio yn amodol ar gymeradwyaeth Achos Busnes Llawn y Porthladd Rhydd gan Lywodraeth y DU.
Ynni Lleol Blaengar Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Penodi Ymgynghorwyr y Gronfa. Cwblhau'r gefnogaeth ar gyfer ysgrifennu ceisiadau SPF gyda rhai hawliadau yn ymestyn i'r chwarter nesaf. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r strategaeth fuddsoddi a'r Achos Busnes Llawn drafft. Cau pecyn cymorth ysgrifennu ceisiadau a ariennir gan SPF. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect yn wyrdd gan fod y datblygiad tuag at yr Achos Busnes Llawn ar y trywydd iawn.
Trawsfynydd Cwmni Eginio	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Trafodaethau parhaus gyda rhanddeiliaid allweddol i ystyried opsiynau posibl ar gyfer Safle Trawsfynydd. 	<ul style="list-style-type: none"> Dim camau gweithredu sylweddol wedi'u cynllunio nes bod penderfyniadau yn cael eu gwneud gan Great British Nuclear (GBN) a Llywodraeth y DU ar ddewis technoleg a dewis safleoedd. 		<ul style="list-style-type: none"> Dim newid; Nid yw Trawsfynydd yn debygol o gael ei ddewis yng ngwedd gyntaf y datblygiadau niwclear newydd. Yn disgwyl am gadarnhad gan Lywodraeth y DU.
Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae Menter Môn ac EDF Hynamics wedi cael trafodaethau cymeriant ('offtake') cadarnhaol gyda gwahanol gwmnïau i'w harchwilio ymhellach yn y flwyddyn newydd. 	<ul style="list-style-type: none"> Trafodaethau pellach gyda Llywodraeth Cymru a DESNZ i archwilio cyfleoedd i sicrhau cytundebau cymeriant gan y sector cyhoeddus; Cadarnhau amserlen datblygu achosion busnes gan fod mwy o sicrwydd cymeriant bellach. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae statws RAG yn parhau i fod yn ambr wrth i'r sefyllfa cymeriant barhau i gael ei chadarnhau.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Nod y Rhaglen


Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caerdybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.



Targed Creu Swyddi
2280



Targed Buddsoddi
GVA
£129bn



Cyfanswm
Buddsoddiad
£355.4m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none">• Neuadd Warren, Brychdyn - Mae Llywodraeth Cymru a'u hymgyngorwyr yn trafod yr adroddiad cydymffurfio drafft ar ddiogelwch maes awyr Neuadd Warren Hall gydag Airbus UK, gyda'r bwriad o gwblhau'r trafodaethau erbyn diwedd mis Ionawr 2025.• Porth y Gorllewin, Wrecsam - Mae WSP wedi cytuno ar ragdybiaethau gwaelodlin i gynnal asesiad Lite Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) ac yn y broses o gasglu tystiolaeth waelodlin i'w defnyddio yn eu model asesu.• Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Mae targed i gwblhau'r cytundeb A106 ym mis Ionawr 2025. Arafodd y trafodaethau ar y cytundeb ariannu gyda Jones Bros yn chwarter 3 ac mae'r PMO yn pwysu i gytuno ar y ddogfen ddrafft cyn y trafodaethau A106.• Parc Bryn Cegin, Bangor - Cafodd Achos Busnes Amlinellol y Prosiect ei gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2024 a chyflwynwyd cais cynllunio ar gyfer y prosiectau i Gyngor Gwynedd.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth y Gorllewin, Wreccsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wreccsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Asesiad WeITAG Lite i barhau gydag adroddiad i'w gyhoeddi yn Ch4 2024/25 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno'r adroddiad gan WSP gydag argymhelliad ynghylch sut i fwrw ymlaen gydag elfen cysylltedd priffyrdd prosiect Porth y Gorllewin. 		<ul style="list-style-type: none"> Cafodd sgôr risg y prosiect ei ddiwygio i ambr ar ôl i Weinidog Trafnidiaeth a Gogledd Cymru nodi y gallai Llywodraeth Cymru adolygu argymhellion yr Adolygiad Ffyrdd ar gyfer Prosiectau Cyfalaf Priffyrdd yn y dyfodol.
Warren Hall, Brychdyn Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae Llywodraeth Cymru, eu hymgyngorwyr ac Airbus UK yn cytuno ar gynnwys yr adroddiad drafft ac yn anelu at gwblhau'r trafodaethau hyn erbyn diwedd mis Ionawr 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau adroddiad ymgynghorydd Llywodraeth Cymru ar allu'r safleoedd i gwrdd â'r achos diogelwch maes awyr gydag Airbus UK. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg y prosiect yn dal yn ambr gan nad yw adolygiad achos diogelwch y maes awyr wedi cael ei asesu a'i gytuno'n llawn gan Airbus UK.
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych Jones Bros (Ruthin) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Mae'r Achos Busnes Llawn wedi ei gymeradwyo, a mae'r prosiect yn symud ymlaen tuag at gyflawni.	<ul style="list-style-type: none"> Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Rownd 3 y Gronfa Ffyniant Bro wedi'i gwblhau gan Lywodraeth y DU a'i ddychwelyd i Gyngor Sir Ddinbych. Cytundeb A106 yn gwneud cynnydd araf Trafodaethau cytundeb ariannu grant yn gwneud cynnydd araf ar ddiwedd yr haf. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyfeiriad am Gymorth Cymhorthdal i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd i'w gofrestru ar wefan yr Awdurdod; Cwblhau'r cytundeb ariannu gyda Jones Bros; Bydd A106 yn cael ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Ddinbych ym mis Ionawr 2025 ond gall lithro. Rhagwelir dechrau Cyfnod 1 ar gyfer diwedd Ch1 2025. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg gwyrdd wedi'i chadw ar gyfer y prosiect ar hyn o bryd.
Parc Bryn Cegin, Bangor Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd. Cyflwynodd SP Projects y cais cynllunio llawn ym mis Rhagfyr 2024. Cwblhau amcangyfrif cyllideb terfynol ym mis Awst. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau a chael cymeradwyaeth i'r Achos Busnes Llawn Hysbysiad llawn o gyfeiriad Cymorth Cymhorthdal. Cwblhau'r Cytundeb Cyd-fenter Dechrau Gwahoddiad i Dendro 		<ul style="list-style-type: none"> Cadw sgôr risg gwyrdd ar gyfer y prosiect gan ei fod ar y trywydd i'w gyflwyno ganol 2025.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth Caergybi Stena Line Ports Limited	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae Stena wedi gofyn am oedi datblygiad y prosiect tra'n disgwyl am ganlyniad eu trafodaethau masnachol gyda'r sector ynni ar y môr. 	<ul style="list-style-type: none"> Deialog barhaus gyda Stena o ran trafodaethau gyda datblygwyr Gwynt ar y Môr i asesu cynnydd. 		<ul style="list-style-type: none"> Symud y sgôr risg i goch gyda'r trafodaethau gyda defnyddwyr terfynol ardaloedd newydd y porthladd i'w cwblhau cyn bwrw ymlaen.
Stiwdios Kinmel	Mae'r prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> Mae trafodaethau gyda'r cyn Reolwr Gyfarwyddwr wedi cadarnhau bod dau ariannwr a chwmi Cynhyrchu Teledu a Ffilm o'r DU â diddordeb yn y prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno cynigion diwygiedig i'w hystyried ym mis Ionawr 2025. PMO i wneud ymchwiliadau ei hun ynghylch galw a chyflenwi gofod stiwdio o fewn y DU. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r sgôr risg yn parhau i fod yn goch hyd nes y bydd rhagor o wybodaeth/trafodaethau.
Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r Tîm Ymgynghori yn datblygu'r Cais Cynllunio Amlinellol. 	<ul style="list-style-type: none"> Dechrau datblygu'r Achos Busnes Amlinellol gan y Cyngor. Cyflwyno cais cynllunio amlinellol 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg gwyrdd wrth i'r prosiect symud ymlaen i gam Achos Busnes / Cynllunio Amlinellol.



Cyng. Jason McLellan
Aelod Arweiniol



Andrew Farrow
Uwch Berchennog
Cyfrifol



David Mathews
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Nod y Rhaglen


Bydd y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth yn uchafu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru gan ddarparu cyfleusterau cefnogol i sicrhau bod gan y rhanbarth y sgiliau i ragori ac i fod gyda'r gorau yn y byd. Bydd y Rhaglen hefyd yn sicrhau ffyniant drwy fanteisio i'r eithaf mewn modd cynaliadwy ar ein hamgylchedd a'n tirwedd.



Targed Creu Swyddi
380



Targed Buddsoddi GVA
£281m



Cyfanswm Buddsoddiad
£41.3m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> Derbyniodd y prosiect Antur Gyfrifol sgôr Ambr yn yr Adolygiad Porth 2, canlyniad cadarnhaol iawn gyda dim ond dau argymhelliaid hanfodol. Cyflwynwyd drafft cyntaf yr Achos Busnes Amlinellol i'r Swyddfa Rheoli Portffolio. Mae'r cais cynllunio llawn ar gyfer y siglen a'r cais cyn-gynllunio ar gyfer y ddwy antur arall wedi eu cyflwyno i Gyngor Gwynedd. Cymeradwywyd y cais am newid am gynhwys y siglen gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ar 6 Rhagfyr 2024. Mae Cytundeb Ariannu Grant y Rhwydwaith Talent Twristiaeth bron â'i gwblhau. Cyflwynwyd y dewis ar gyfer yr is-ganolfan derfynol, mae Grŵp Llandrillo-Menai yn drafftio Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer cymeradwyaeth llawn. Penderfyniad Snowdonia Hospitality and Leisure i dynnu'n ôl o fod angen cyllid y Cynllun Twf, ail broses o ddewis is-ganolfan ar y gweill. Hwb Economi Wledig Glynllifon wedi cyflwyno'r newid arfaethedig i fwrdd y rhaglen. Bydd proses cais am newid ffurfiol yn dechrau yn Chwarter 4.



Cyng. Charlie McCoubrey
Aelod Arweiniol



Sioned Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Eilw Hughes
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos dros newid	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwynodd y tîm prosiect y gwaith o ail-gwmpasu'r prosiect i fwrdd y rhaglen, a ofynnodd am ddechrau'r broses ffurfiol o gyflwyno cais am newid. 	<ul style="list-style-type: none"> Cais am newid i'w gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Chwefror. Drafftio'r BJC sy'n ofynnol ar gyfer elfennau newydd o'r prosiect os cymeradwyir cais am newid. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r sgôr yn parhau i fod yn goch oherwydd oedi gyda'r prosiect ac ail-gwmpasu'r prosiect.
Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai	Cyflawni prosiect	<ul style="list-style-type: none"> Drafftio terfynol y Cytundeb Ariannu Grant. Cyflwyno dewis yr Is-ganolfan derfynol i'r bwrdd rhaglen a chymeradwyaeth i symud i ddrafftio'r Achos Cyfiawnhad Busnes. Ail-frandio wedi'i gwblhau gan Grŵp Llandrillo Menai Penderfynodd Snowdonia Hospitality and Leisure dynnu eu cais yn ôl am gyllid y Cynllun Twf; fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn rhan o'r prosiect ehangach. 	<ul style="list-style-type: none"> Cytundeb ariannu i'w gwblhau. Dechrau'r gwaith adeiladu. Cyflwyno BJC ar gyfer dewis yr is-ganolfan derfynol. Parhau i weithio gyda'r is-ganolfan arfaethedig cyn gwneud y penderfyniad terfynol a chyflwyno cais am newid. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr gwyrdd gan fod yr Achos Busnes Terfynol wedi'i gymeradwyo a chynnydd da wedi'i wneud ar y Cytundeb Ariannu Grant.
Anturiaethau Cyfrifol ZipWorld	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad Porth 2 - Sgôr ambr, adolygiad llwyddiannus gyda dim ond dau argymhelliad hanfodol. Cymeradwyo'r cais am newid am gynnwys y siglen wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais ar 6 Rhagfyr 2024. Cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer y siglen ar safle'r Penrhyn. Ceisiadau cyn-gynllunio ar gyfer y Fforiwr llechi a'r car cebl ar safle Llechwedd. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer cymeradwyaeth y Bwrdd Mynd i'r afael ag argymhellion yr adolygiad Porth 2. Ymgysylltu â rhanddeiliaid. Cymeradwyo cynllunio ar gyfer y siglen Cyflwyno ceisiadau cynllunio llawn ar gyfer y ddwy antur ar safle Llechwedd. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr ambr yn bennaf oherwydd y risg gynllunio ond gwnaed cynnydd da gyda chymeradwyo cais am newid a'r Achos Busnes Amlinellol.

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Nod y Rhaglen


Cyfnertu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.



Targed Creu Swyddi
180



Targed Buddsoddi
GVA
£114m



Cyfanswm
Buddsoddiad
£39.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> Cynnydd da gyda'r gwaith o adeiladu'r Ganolfan Peirianeg Menter ac Opteg gyda'r adeilad yn dal dŵr a'r gwaith gyda'r gosodion mewnol. Adnabuwyd contractwr profiadol ar gyfer y gwaith adnewyddu yn Optig, rhywfaint o newidiadau oherwydd costau chwyddiant uwch. Lanswyd proses gaffael bellach ar gyfer offer y prosiect. Ar hyn o bryd, mae'r prosiect yn datblygu ei achosion Cyfiawhad Busnes. Prosiect Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn mynd rhagddo'n dda, gyda gwaith adnewyddu Henfaes yn unol a'r amserlen. Caffael yr offer ar y gweill.



Gwag
Aelod Arweiniol



Tony Ward
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Eilw Hughes
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)




Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Wrecsam	Cyflawni Prosiect	<ul style="list-style-type: none"> Derbyniwyd ymatebion tendr OpTIC, o ganlyniad i gostau chwyddiant, mae'r dyfynbrisiau wedi arwain at addasu'r cwmpas gwreiddiol; cynhaliwyd gweithdy gydag Uchelgais Gogledd Cymru i wneud penderfyniad ar ffordd bragmatig ymlaen i sicrhau na fyddai'r addasiad yn cael ei adlewyrchu wrth sicrhau'r buddion. Dim angen am gyllid ychwanegol. Cyhoeddwyd ITT ar gyfer offer Plas Coch. Datblygu Achosion Cyfiawnhad Busnes. 	<ul style="list-style-type: none"> Awdurdodi dyfarnu'r tendr ar gyfer adnewyddu ac offer OpTIC. Cymeradwyaeth derfynol i ddyfarnu'r tendr ar gyfer offer Plas Coch. Cymeradwyo'r Achos Cyfiawnhad Busnes. Bwrw ymlaen â gwaith adeiladu Plas Coch yn unol â'r cynllun. 		<ul style="list-style-type: none"> Prosiect yn cael ei gyflwyno ac ar y trywydd iawn
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor	Cyflawni Prosiect	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r cynnydd ar safle Henfaes ar y trywydd iawn Proses gaffael ar gyfer offer ar gyfer Thoday (gwedd 1) yn datblygu law yn llaw â'r PMO yn ôl yr angen. 	<ul style="list-style-type: none"> Camau olaf adnewyddu Henfaes Cwblhau'r broses gaffael. 		<ul style="list-style-type: none"> Prosiect yn cael ei gyflwyno ac ar y trywydd iawn

09 PIBLINELL CYFLAWNI PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

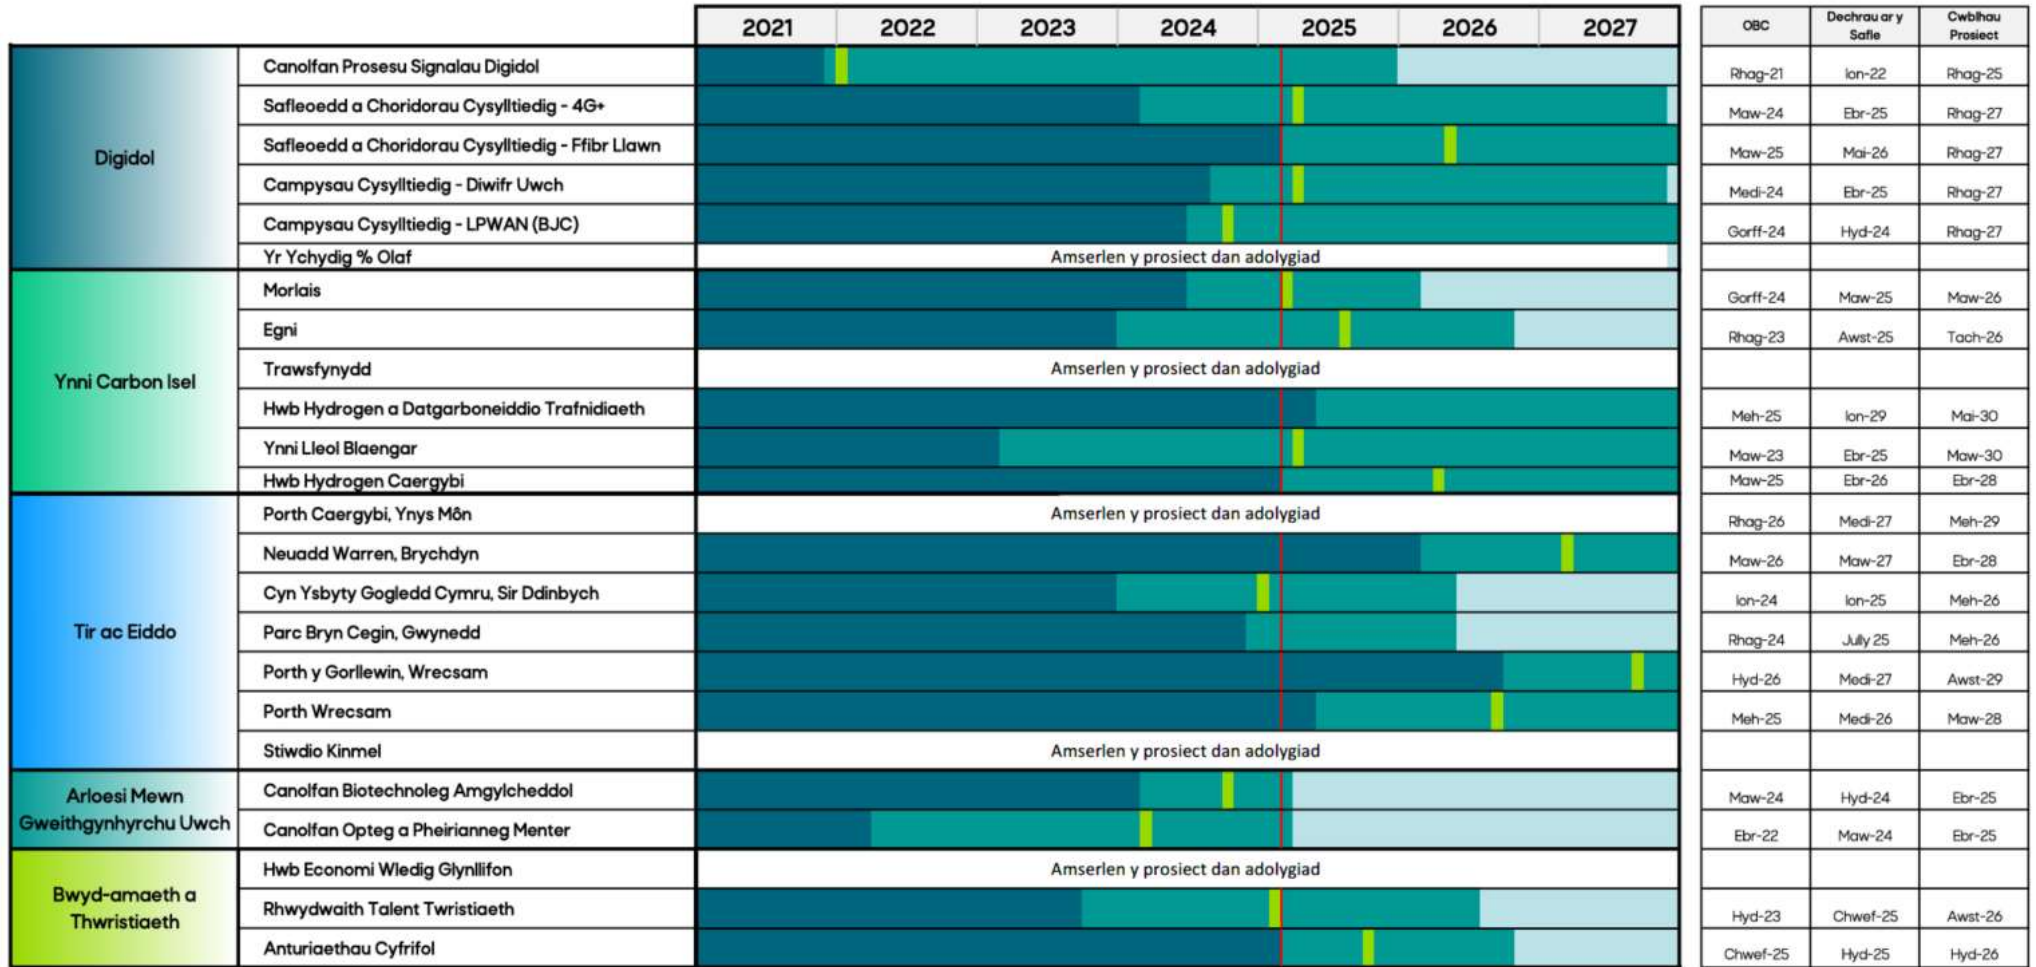

■ Cyfnod Datblygu a Chymeradwyo Achos Busnes (Cymeradwyo Achos Busnes Aminellol cyn caffael)
■ Cam Caffael a Chyflawni Prosiect (Yn cynnwys cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn ar ôl caffael)

■ Dechrau ar y Safle
■ Cyfnod Gweithredol a Gwireddu Manteision

10 TRACIWR AMCANION – TROSOLWG O GYFLAWNI

		Targedau Achos Fusnes Portffolio 2024		Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd			Gwir		
		Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC/ FBC**	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)		2.96	FBC	33	2.96	16	2.33	
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	133	4.17	OBC	130	4.17	n/a	n/a	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	4G+	82	10.04	OBC	TBC at FBC	n/a	n/a	0
		Fibre	35		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Campysau Cysylltiedig	LPWAN	20	39.04	BJC	20	1.14	0	0
		Advanced Wireless	165		OBC	130	20	n/a	n/a
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)		13.87	OBC	230	13.87	n/a	n/a	
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	88	130.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Egni	49	3.94	OBC	49	3.94	n/a	n/a	
	Ynni Lleol Blaengar	177	102.00	OBC	174	106.0	n/a	n/a	
	Trawsfynydd	111	244.12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Hwb Hydrogen Caergybi	20	28.77	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Prosiect wedi dynnu nol	33	31.64	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	360	43.36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Warren Hall, Brychdyn	445	69.76	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	70	94.70	FBC	70	107.0	0	0	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	47	6.62	OBC	54	7.11	n/a	n/a	
	Porth Caergybi	647	170.70	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Porth Wrecsam	150	14.37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Stiwdios Kinmel	200	32.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Bwyd-Amaeth a Thwrystiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	92	16.79	OBC	96	12.85	n/a	n/a	
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	68	19.03	FBC	68	19.03	0	0	
	Anturiaethau Cyfrifol	175	12.40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Arloesi mewn Gweithygyddiaeth Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	78	18.12	FBC	70	18.12	0	4.81	
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	65	3.46	BJC	65	3.46	0	0	
Cyfanswm Portffolio Cynllun Twf			5.15				7	1.51	
Growth Deal Portfolio Total				8 OBC 6 FBC	Wedi gymeradwyo		Cyflawni		
		3,575	1,123		1,189	319.65	23	8.65	

* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 15% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

** OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

11 CYNLLUN TWF – PROFFIL GWARIANT CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Noddw'r Prosiect	2021/22 (£m)	2022/23 (£m)	2023/24 (£m)	2024/25 (£m)	2025/26 (£m)	2026/27 (£m)	2027/28 (£m)	2028/29 (£m)	2029/30 (£m)	2030/31 (£m)	2031/32 (£m)	2032/33 (£m)	2033/34 (£m)	2034/35 (£m)	Cyfanswm (£m)
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	0.12	1.66	0.37	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Digidol	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	3.27	3.27	0.94	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Digidol	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	5.10	9.80	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
Digidol	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Ynni Carbon Isel	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
Ynni Carbon Isel	Trawsfynydd	Cwmni Eginio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.50	5.00	5.70	5.00	0.00	19.70
Ynni Carbon Isel	New H2	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.30	2.30	3.10	1.53	0.00	0.00	11.23
Ynni Carbon Isel	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.25	9.25	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
Ynni Carbon Isel	Prosiect wedi'u dynnu nol	n/a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
Ynni Carbon Isel	Hwb Hydrogen Cargybi	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
Tir ac Eiddo	Porth Caergybi	Stena Line	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
Tir ac Eiddo	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
Tir ac Eiddo	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
Tir ac Eiddo	Parc Bryn Cegin	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
Tir ac Eiddo	Stiwdios Kinmel	Stage Fifty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
Tir ac Eiddo	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistrefol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
Arloesi mewn Gweithygnhyrchu Uwch	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	2.71	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Arloesi mewn Gweithygnhyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Wrecsam	0.00	0.00	0.75	6.52	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
Bwyd-Amaeth a Thwrstiaeth	Canolfanwynt Economi Gwledig Glynlifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
Bwyd-Amaeth a Thwrstiaeth	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	1.57	2.85	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
Bwyd-Amaeth a Thwrstiaeth	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	3.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2.15% i gyllido cyllideb referniw Uchelgais Gogledd Cymru			0.22	0.28	0.56	0.90	1.35	0.66	0.46	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.07	0.05	5.15
Cyfanswm y Portffolio			0.34	1.94	1.68	12.51	29.61	40.86	59.28	42.58	22.45	8.10	8.20	7.33	5.07	0.05	240.00

Mae 2021/22, 2022/23 a 2023/24 yn wariant gwirioneddol. Mae'r proffil sy'n weddill fel y rhagwelir yng Nghyllideb Cyfalaf 2024/25.

Mae Proffil Cyfalaf wedi'i ddiweddarau fel rhan o'r Adolygiad Ariannol (Rhagfyr 2024).

12 PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF: PROFFIL DYRANIAD CYLLID CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	Proffil 24/25 (£m)	YTD Gwirioneddol	Amrywiad (£m)*	Rhesymeg
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.81	0.00	-0.81	Disgwylir yr hawliad nesaf cyn diwedd y flwyddyn ariannol.
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.15	0.00	-0.15	
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw geisiadau busnes llawn wedi'u cymeradwyo. Disgwylir gwariant yn ail hanner y flwyddyn yn dilyn cymeradwyaeth Achosion Busnes Llawn.
	NEW-H2	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Eginio	0.00	0.00	0.00	
	Prosiect wedi dynnu nol		0.00	0.00	0.00	
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	Mae Prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru yn symud i'r cam cyflawni a bydd yn dechrau hawlio yn 2025/26.
	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Porth Caergybi	Stena Line	0.00	0.00	0.00	
	Stiwdios Kimmel		0.00	0.00	0.00	
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	Mae Achosion Busnes Llawn y Rhwydwaith Talent Twristiaeth wedi'u cymeradwyo, gan ddisgwyl gwariant yn 2024-25.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	3.14	0.00	-3.14	
	Anturiaethau Gyfrifol	Zip World	0.00	0.00	0.00	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Wrecsam	6.52	4.06	-2.46	Mae'r trydydd hawliad am EEOC wedi'i dalu. Bydd y pedwerydd a'r pumed hawliad hefyd yn cael eu cyflwyno i'w prosesu o fewn y flwyddyn ariannol hon.
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	2.71	0.00	-2.71	
Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio			11	0.45	-0.65	
Cyfanswm			14.43	4.51	-9.92	

ATODIAD A – CRYNODEB O BROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

	Prosiect	Ariannwr	Crynodeb
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn gyda'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawfi 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	Yr Ychydig % Olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill ac na allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffiberoptig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystad o opsiynau cysylltiedig digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	NEW-H2	Uchelgais Gogledd Cymru	Cefnogi cyflwyniad prosiect arddangos sy'n ymwneud â chynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn rhwydweithiau trafniadaeth rhanbarthol.
	Egni	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnffuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd.
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	Trawsfynydd	Cwmni Eginio	Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch (AMR). Ar y cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn.
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafniadaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.
	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg.
	Porth Caergybi	Stena Line	Sicrhau dyfodol Porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol.
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafniadaeth aml-ddull gyda chysylltiadau at deithio llesol.
	Stiwdios Kinmel		Bydd y prosiect hwn yn dylunio, adeiladu a gweithredu stiwdios ffilm a theledu ym Mharc Menter Tir Llwyd, ynghyd ag academi hyfforddi ac unedau deori.
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystad o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystad o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlyn gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebel newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys plattform gwyllo i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws.
Arloes mewn gweithgynhyr chu uwch	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnffuddsoddiad i Gymru.
	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Wrecsam	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddiad a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.
